
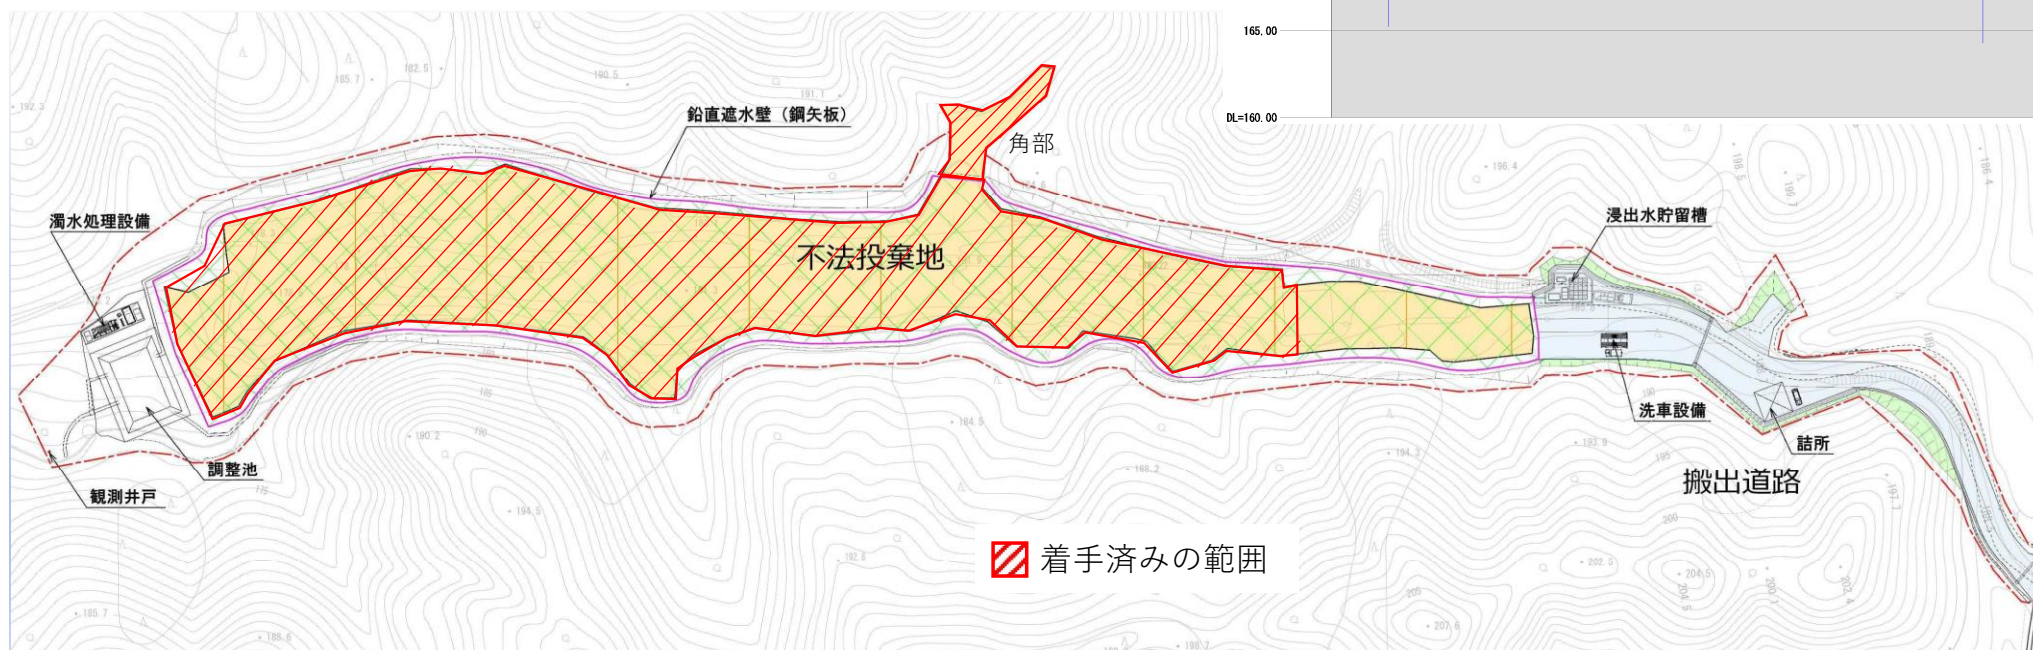


県営処分場エコグリーンとちぎ安全推進協議会 第4回会議

北沢不法投棄物の撤去について

1 撤去工事の概要

発注者 : 栃木県
工事場所 : 栃木県那須郡那珂川町小口、小砂地内
工事期間 : 令和4(2022)年度～令和7(2025)年度を予定
事業者 : 株式会社クリーンテックとちぎ
対象地 : 約 8,700m²
撤去量 : 約51,000m³ (周辺汚染土壌含む)

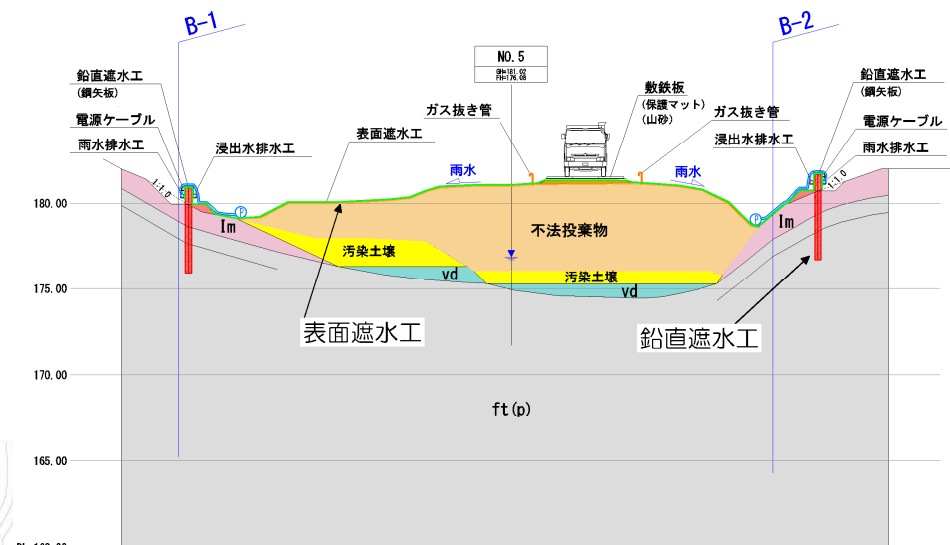

2 不法投棄物の撤去・運搬

- ・不法投棄物を掘削後、車両積み込み前にエコグリーンとちぎで受入可能な廃棄物であることを確認
- ・運搬は県道27号那須黒羽茂木線を利用
- ・不法投棄物に触れた雨水等（汚水）についても、エコグリーンとちぎに運搬
- ・車両は廃棄物の飛散・流出が起きないように天蓋車を使用
- ・運搬は環境保全協定に基づき、月曜日から土曜日の8:30～16:30に実施



不法投棄物の運搬に用いる車両



汚水の運搬に用いる車両



3 不法投棄物の撤去実績

| | 単位 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | | | | | 合計 |
|--------|----|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 不法投棄物 | トン | 2,670 | 41,243 | 4,710 | 4,664 | 4,073 | (4,200) | (2,500) | 57,360 |
| うち汚水 | トン | 562 | 3,472 | 188 | 267 | 149 | (200) | (200) | 4,638 |
| 撤去の進捗率 | % | 3.1 | 68.3 | 73.3 | 79.2 | 90.2 | (96.4) | (100) | — |

※ 青字の部分は計画値

※ 進捗率は撤去の体積で計上しているため不法投棄物の撤去量とは一致しない



不法投棄地の掘削の状況



不法投棄物



不法投棄地における選別状況

4 工事工程


- ・ 令和5年9月にエコグリーンとちぎ被覆施設内に不法投棄物の前処理施設を設置
- ・ 令和5年12月から不法投棄物の撤去に着手
- ・ 撤去完了は令和7年8月末を予定
- ・ 撤去完了後、鋼矢板の撤去等の復旧工を実施予定



破碎機（不法投棄物を埋立するため細かくします）



前処理施設

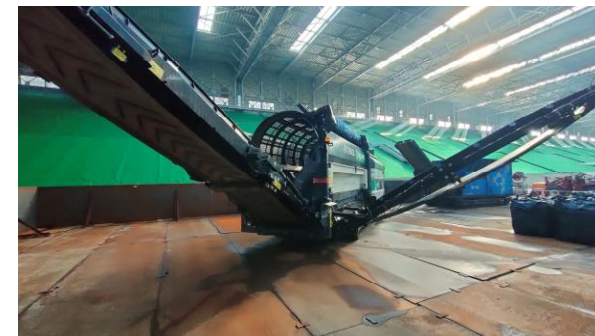

ふるい機（不法投棄物のふるい分けを行いサイズの大きなものは破碎機で細かくします）

5 外部へ搬出している廃棄物等



感染性廃棄物



ガスボンベ



乾電池



低濃度PCB含有機器



掘削・ふるい分け状況



掘削・ふるい分け状況



掘削状況



掘削状況



浸出水搬出状況



不法投棄物積み込み状況



不法投棄物運搬状況



破碎機投入状況（廃プラスチック）



破碎機稼働状況



展開検査状況（管理型混合廃棄物）



展開検査状況
