


令和7年度 第1回 栃木県公共事業評価委員会 一括審議案件一覧

事業 区分	事業名		事業延長 ・計画諸元	全体 事業費 (億円)	事業 期間	事業進捗 [用地補償] (事業費ペー ス)	事業全体 B／C	事業の主な変更点及び理由	再評価の視点	対応方針 (原案)
街路	1	街路づくり事業 足利佐野都市計画道路3・5・101号 毛野西新井線 足利市 西新井町	L=813.3m W=15.0m	23.0	H31 (R7) ～R12	64% [67%]	電共、 交安事業 のため 対象外	・計画事業期間の延伸 理由：用地取得に不測の時 間を要しているため	本事業箇所は、用地を67% 取得済であり、一部工事にも 着手していることから、引き続 き現計画で事業を継続するこ とが妥当と考える。	継 続

街路づくり事業 足利佐野都市計画道路 3・5・101号毛野西新井線 事業概要

路線・河川名 事業区間	事業延長 計画諸元	全体事業 費 (億円)	事業期間	事業進捗 【用地補償】 (事業費 ベース)	事業全体 B/C
足利佐野都市計画道路 3・5・101号 足利市 西新井町	L = 813.3m W = 15.0m	(23.0) 23.0	(R7) H31～R12	64% 【67%】	電共、 交安事業 のため 対象外

整備内容	歩道整備(現道拡幅)
------	------------

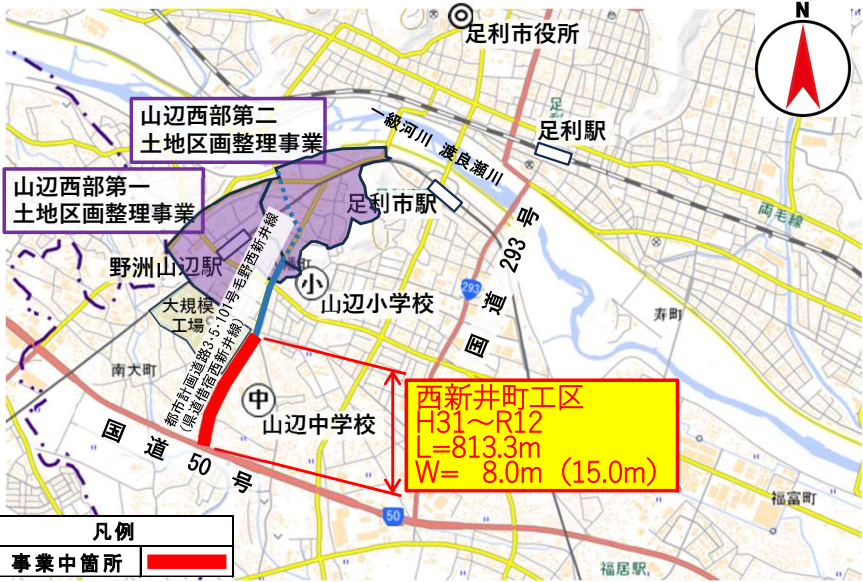

事業の整備効果等

- 歩道設置や自転車走行空間を創出することによる、歩行者・自転車の安全確保
- 足利市の中心地から国道50号へのアクセス向上
- 土地区画整理事業との連携によるまちづくりへの寄与

<現況>




<整備後>



標準横断面図

<現況>

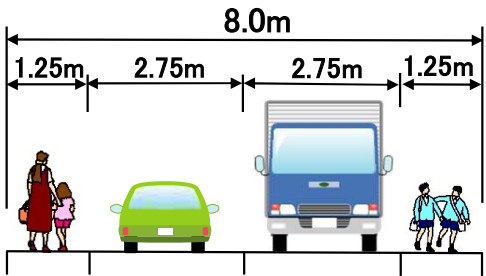

<計画>

